



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIE**



PROGRAMA DE AULAS NIVEL INICIAL

INFORME DE AVANCE
FEBRERO 2026

PROGRAMA DE NUEVA COBERTURA AULAS DE NIVEL INICIAL - CONCEPTO




El programa de construcción de aulas de nivel inicial es una iniciativa impulsada por el actual Gobierno que encabeza el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, a través del Ministerio de Educación y la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), con el fin de ampliar la cobertura para niños de 3 a 5 años de edad en la República Dominicana.

El concepto de aula inicial es un espacio educativo diseñado para la educación inicial de niños en sus primeros años de vida, generalmente desde la educación preescolar hasta los primeros grados de educación primaria.

Características claves del aula inicial: ambientes acogedores, que fomenten el aprendizaje, desarrollo integral, interacción social, currículo flexible y participación activa.

AULAS DE NIVEL INICIAL – DISEÑO MODULO DE 1 AULA

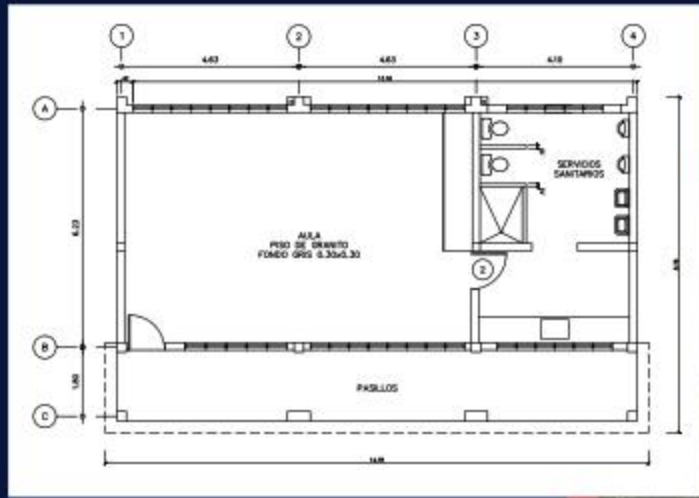

1 PLANTA DIMENSIONADA


1 = 75 M

CARACTERISTICAS :

- Área de Construcción : 123.20 mt²
- 1 Aula de 54.00 mt², para 20 alumnos.
- Con baños para niños y niñas.
- Deposito – cocina
- Pasillo en su parte frontal
- Área de juego infantil
- Cierre perimetral



AULAS DE NIVEL INICIAL – DISEÑO MODULO DE 2 AULAS

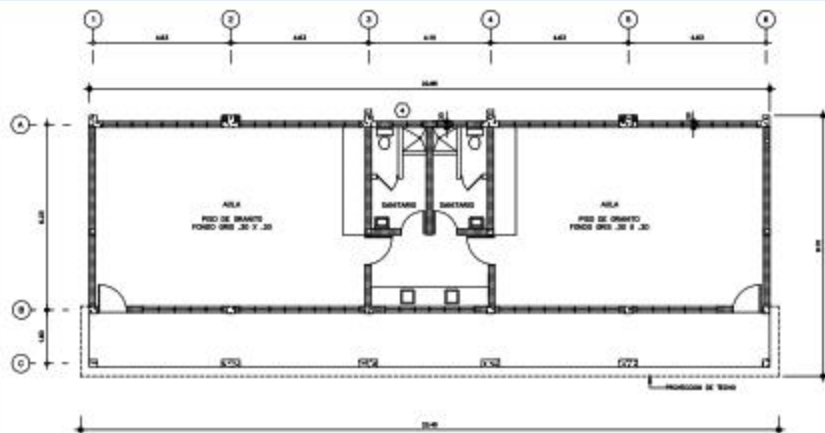

CARACTERISTICAS :


- Área de Construcción : 205.20 mt²
- 2 Aulas de 54.00 mt², para 20 alumnos.
- Con 2 baños para niños y niñas.
- Deposito – cocina
- Pasillo en su parte frontal
- Área de juego infantil
- Cierre perimetral

PLANTA DIMENSIONADA

1

1 = 75 M

AULAS DE NIVEL INICIAL – DISEÑO MODULO DE 3 AULAS

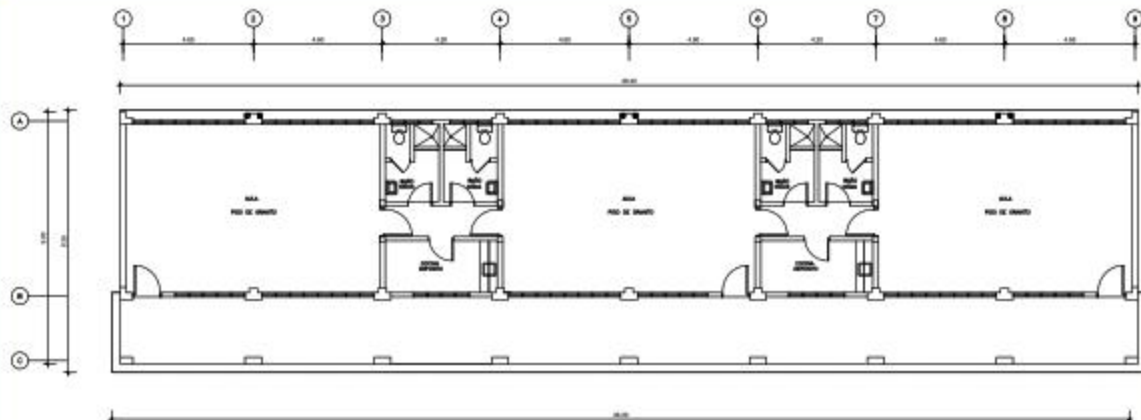

CARACTERISTICAS :

- Área de Construcción : 326.70 mt²
- 3 Aulas de 54.00 mt², para 20 alumnos.
- Con 4 baños para niños y niñas.
- Deposito – cocina
- Pasillo en su parte frontal
- Área de juego infantil
- Cierre perimetral


01

A-1


PLANTA DIMENSIONADA

ESC.: 1:75

AULAS DE NIVEL INICIAL – DISEÑO TIPO ARTICULADO DE 2 Y 3 AULAS

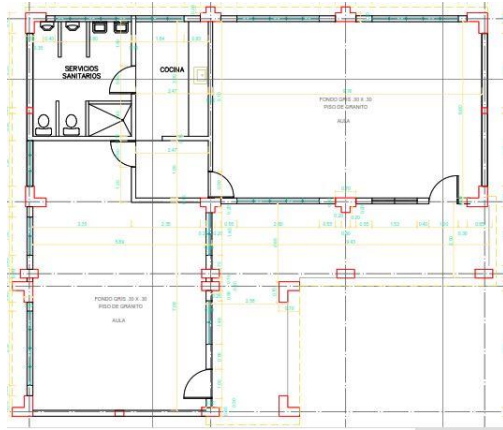

**MODULO DE 2 AULAS
ARTICULADO**

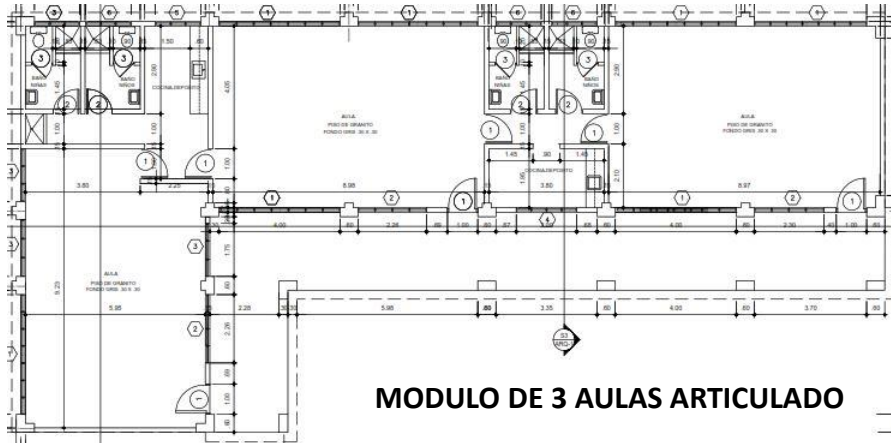

MODULO DE 3 AULAS ARTICULADO




CARACTERISTICAS :

- Aulas de 54.00 metros cuadrados, para 20 alumnos.
- Con baños para niños y niñas.
- Deposito – cocina
- Pasillo en su parte frontal
- Área de juego infantil
- Cierre perimetral en malla ciclónica

PROGRAMA DE AULAS NIVEL INICIAL - CONTRATADAS

RESUMEN GENERAL DEL PROGRAMA DE AULAS DE INICIAL

DESCRIPCION	CANTIDAD DE AULAS	CANTIDAD DE PLANTELES	CANTIDAD DE CONTRATOS
AULAS DE INICIAL CONTRATADAS POR SORTEO MINERD-CCC-SO-2023-0008	333	153	103
AULAS DE INICIAL CONTRATADAS POR LICITACION MINERD-CCC-LPN-2023-018	1353	611	142
TOTAL GENERAL	1,686	764	245

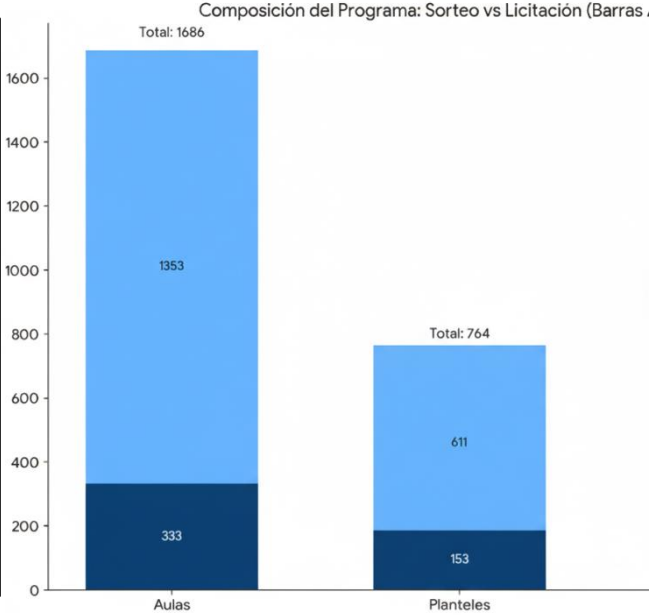

AULAS DE NIVEL INICIAL- DISTRIBUCION



ENCARGADO ZONALES	PROVINCIA	CANTIDAD DE PLANTELES	CANTIDAD DE AULAS INICIAL
JUNIOR TAVERAS	Monseñor Nouel	16	36
JUNIOR TAVERAS	Sanchez Ramirez	19	35
JUNIOR TAVERAS	La Vega	31	55
ALEXIS SOSA	Españillat	22	43
ALEXIS SOSA	Duarte	40	90
AARON HERNANDEZ	Hermanas Mirabal	14	27
AARON HERNANDEZ	Maria Trinidad Sanchez	15	24
AARON HERNANDEZ	Samana	7	14
ALEXIS SOSA	Santiago	69	152
HIPOLITO GARCIA	Valverde	18	54
ALEXIS SOSA	Puerto Plata	23	56
HIPOLITO GARCIA	Santiago Rodriguez	11	37
HIPOLITO GARCIA	Monte Cristi	27	50
HIPOLITO GARCIA	Dajabon	8	18
MARIAN ROMERO	San Cristobal	42	92
HIPOLITO CAPANO	San Jose de Ocoa	4	6
HIPOLITO CAPANO	Peravia	26	70
HIPOLITO CAPANO	Azua	25	60
KENIA MENDEZ	San Juan	41	70
CLARIBEL ADAMES	Bahoruco	18	58
MARIAN ROMERO	Barahona	20	52
KENIA MENDEZ	Elias Piña	12	25
CLARIVEL ADAMES	Independencia	14	43
MARIAN ROMERO	Pedernales	5	10
FRANCIS ZAPATA	Santo Domingo	94	221
MARISLEYDA/ FRANCISCO MORA	Distrito Nacional	7	19
CARLOS CANELA	Monte Plata	45	81
CARLOS CANELA	Hato Mayor	20	34
CARLOS CANELA	San Pedro de Macoris	32	69
IVAN CASTRO	El Seibo	8	17
IVAN CASTRO	La Romana	16	40
IVAN CASTRO	La Altagracia	15	28
TOTAL		764	1686


RELACION DE AVANCE EJECUCION DE OBRAS - PROGRAMA AULAS DE NIVEL INICIAL

TABLA RESUMEN AVANCE AULAS DE NIVEL INICIAL			
DESCRIPCION	CANTIDAD DE AULAS	CANTIDAD DE PLANTELES	ACCIONES A TOMAR
AULAS TERMINADAS A LA FECHA DICIEMBRE 2025	105	47	AGOTAR PROCESO DE CIERRE DE EXPEDIENTE HASTA FINALIZAR ENTREGA.
AULAS TERMINADAS EN 2026	12	5	AGOTAR PROCESO DE CIERRE DE EXPEDIENTE HASTA FINALIZAR ENTREGA.
AULAS A TERMINAR EN LOS PROXIMOS 6 MESES	244	105	DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS EN EL AREA JURIDICA Y FINANCIERA , ATRAVES DE LOS ZONALES Y DIRECTAMENTE, EN LO QUE SE LE HACE LA CUBICACION DE CORTE Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. (LEY 83-24)
AULAS A TERMINAR EN LOS PROXIMOS 12 MESES (ENTRE 60% - 30%)	329	114	DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS EN EL AREA JURIDICA Y FINANCIERA , ATRAVES DE LOS ZONALES Y DIRECTAMENTE, EN LO QUE SE LE HACE LA CUBICACION DE CORTE Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. (LEY 83-24)
AULAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN ENTRE 30% - 5%	400	170	DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS EN EL AREA JURIDICA Y FINANCIERA , ATRAVES DE LOS ZONALES Y DIRECTAMENTE, EN LO QUE SE LE HACE LA CUBICACION DE CORTE Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. (LEY 83-24)
AULAS EN LABORES PRELIMINARES (TOPOGRAFIA, EST. DE SUELO, COLOCACION VALLA Y CIERRE PERIMETRAL, OTROS)	96	47	DAR SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS PARA QUE INICIEN TRABAJOS EN OBRA EN LO QUE SE LE HACE LA CUBICACION DE CORTE Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. (LEY 83-24)
AULAS NO INICIADAS (SIN CAUSA JUSTIFICADA)	132	64	SE CONTACTARA A LOS CONTRATISTAS Y SE LE EMPLAZARA A QUE INICIEN EN UN TIEMPO DETERMINADO
AULAS NO INICIADAS (CONTRATISTAS CON OTRO PLANTEL ACTIVO)	24	11	SE CONTACTARA A LOS CONTRATISTAS Y SE LE EMPLAZARA A QUE INICIEN EN UN TIEMPO DETERMINADO, EN LO QUE SE LE HACE LA CUBICACION DE CORTE Y PRESUPUESTO DE TERMINACION. (LEY 83-24)
AULAS NO INICIADAS (CONTRATISTA NOTIFICADO)	10	5	SE CONTACTARA AL CONTRATISTA Y SI NO REINICIA TRABAJOS EN OBRA , SE INICIA PROCESO DE RESCINSION
AULAS NO INICIADAS (EN PROCESO DE SOLUCIONES TECNICAS Y DE DISEÑO)	162	111	DAR SEGUIMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES PARA AGILIZAR LOS EXPEDIENTES
AULAS EN PROCESO DE REUBICACION	74	38	DAR SEGUIMIENTO EN PLANIFICACION HASTA TENER OFICIOS DE REUBICACION
AULAS SIN TERRENO	90	43	AGOTAR BUSQUEDA EN ESPACIOS POSIBLES DE PLANTELES ESCOLARES
AULAS EN PROCESO DE RESCINSIÓN	8	4	CONCLUIR RESCINSION Y RECONTRATAR
TOTAL GENERAL	1686	764	
PROCESO DE LICITACION PROGRAMADO PARA NUEVA CONSTRUCCION	251	155	

RELACION DE ESTADO FINANCIERO PROGRAMA AULAS DE NIVEL INICIAL

MONTO TOTAL CONTRATADO AULAS INICIALES	7,137,208,524.95	100%
MONTO TOTAL PAGADO + AVANCES AULAS INICIALES	3,078,249,914.84	43%
MONTO TOTAL CUBICADO EN CIRCUITO INTERNO	45,425,001.16	1%
MONTO TOTAL PENDIENTE DE PAGO FINANCIERO	439,713,159.42	6%

DIAGRAMA FINANCIERO

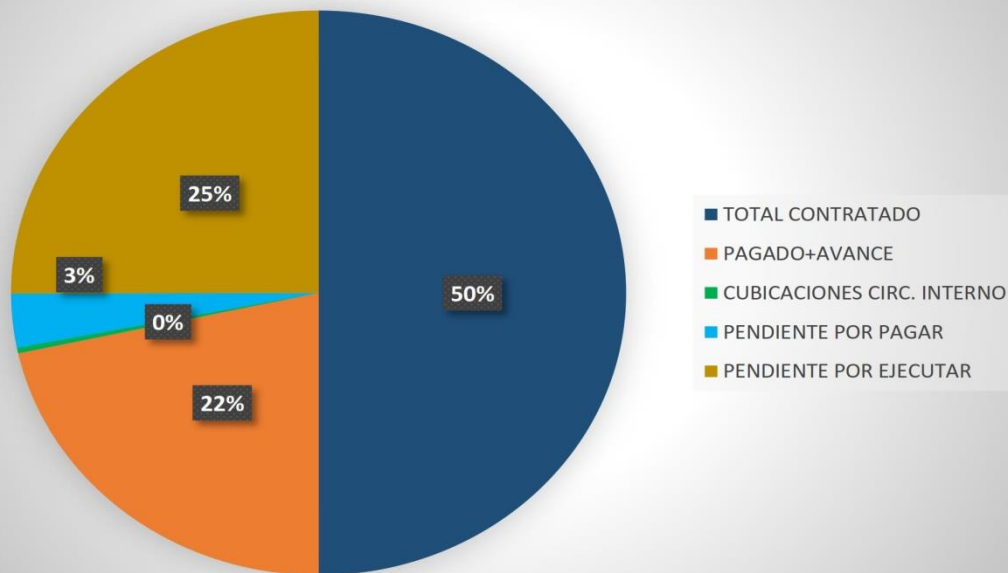

MONTO TOTAL PENDIENTE A EJECUTAR

3,573,820,449.53

50%



PROGRAMA DE AULAS AUXILIARES

INFORME DE AVANCE
FEBRERO 2026

PROGRAMA DE AULAS AUXILIARES - CONCEPTO



Las aulas auxiliares o móviles, son edificaciones prefabricadas, modulares y temporales que se instalan en espacios disponibles en los planteles escolares. Estas aulas son diseñadas para ser instaladas rápidamente y tienen la facilidad de que pueden ser trasladadas con facilidad. Este tipo aulas, son construidas en módulos prefabricados que pueden ser combinados para crear diferentes configuraciones y tamaños en los recintos educativos.



PROGRAMA DE AULAS AUXILIARES – BENEFICIOS y USOS



BENEFICIOS

- Flexibilidad modular adaptable.
- Rapidez en su instalación.
- Solución inmediata y temporal de infraestructura.
- Ahorro de costos inicial.
- Ahorro de tiempo.


JUSTIFICACIÓN DE USO

- Emergencia educativa de cupo.
- Riesgos sanitarios y estructurales .
- Interés público y social prevalente.
- Inmediatez requerida.




AULAS AUXILIARES - DISEÑO TIPO

Las aulas auxiliares tienen un área de 40 mt² aproximadamente, siendo estructuras reubicables, removibles y reusables, resistentes a sismos sobre 7 grados Richter y a vientos de 120 km/h, de materiales anticorrosivos con tecnología no tóxica y con tratamiento aislante térmico para mayor confort en su hábitat.

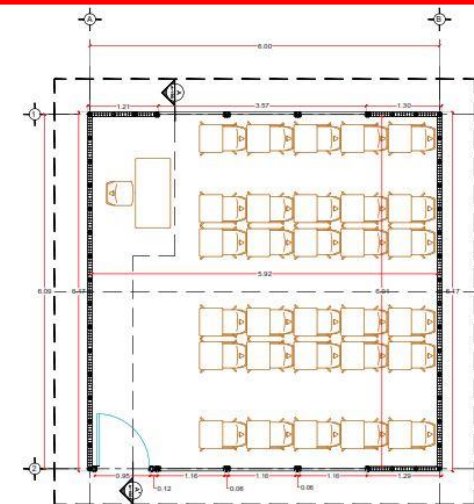

PLANTA ARQUITECTONICA


ESCALA 1/100 MODELO 1 AULA MOVIL

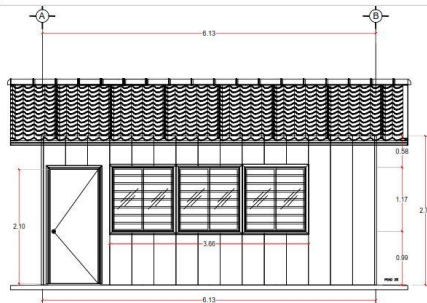

FACHADA FRONTAL

ESCALA 1/100 MODELO 1 AULA MOVIL


Activar V
Ve a Config

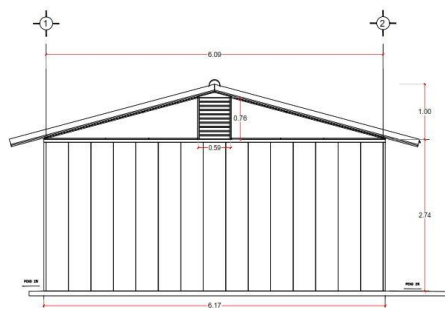

FACHADA LATERAL IZQUIERDA


ESCALA 1/100 MODELO 1 AULA MOVIL

Acti

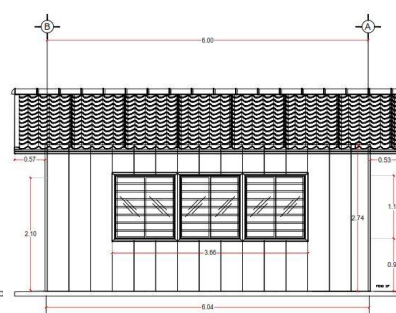

FACHADA POSTERIOR


ESCALA 1/100 MODELO 1 AULA MOVIL

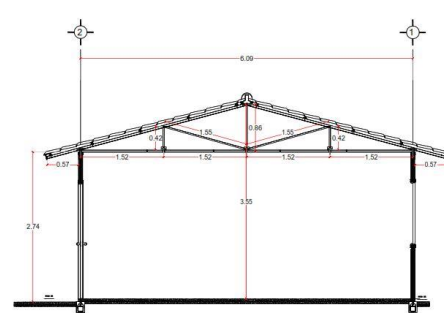




CORTE TRANSVERSAL

ESCALA 1/100 MODELO 1 AULA MOVIL

AULAS AUXILIARES - DISEÑO TIPO

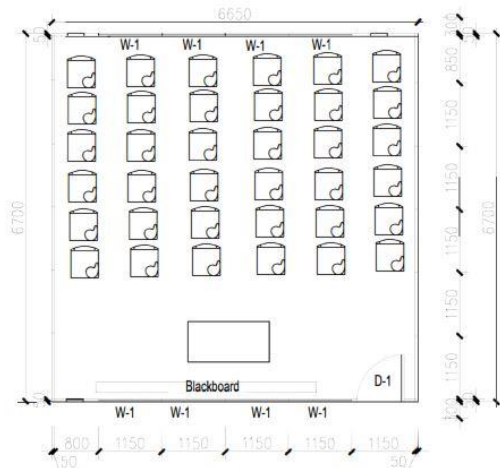

Las aulas auxiliares tienen un área de 40 mt² aproximadamente, siendo estructuras reubicables, removibles y reusables, resistentes a sismos sobre 7 grados Richter y a vientos de 120 km/h, de materiales anticorrosivos con tecnología no tóxica y con tratamiento aislante térmico para mayor confort en su hábitat.

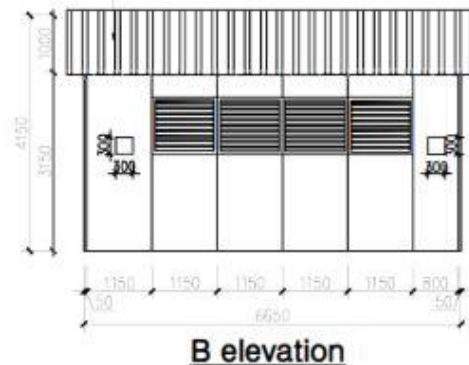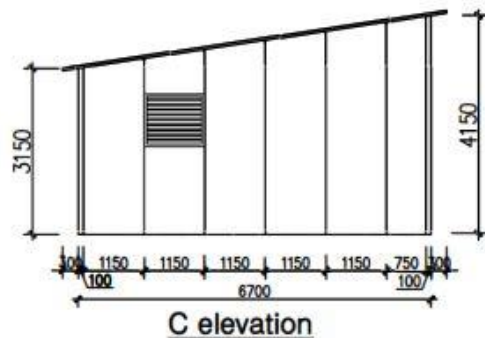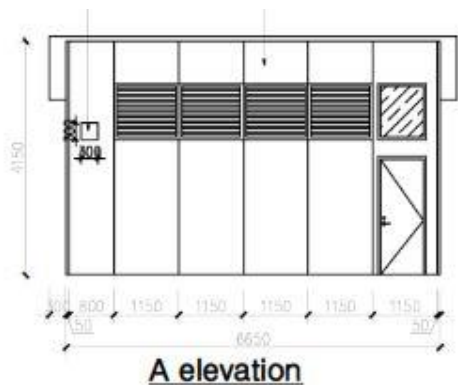


RELACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS AUXILIARES 2025 - 2026

INSTALADAS EN EL AÑO 2025		
DESCRIPCION	CANTIDAD AULAS AUXILIARES	MONTO DE INVERSION
SEGÚN LICITACION DIE-MAE-PEUR-2025-0001	302.00	\$831,232,809.04
ADENDA DEL 25% DIE-MAE-PEUR-2025-0001	48.00	\$201,609,850.22
SUB-TOTAL CONTRATOS (2020 / 2025)	350.00	\$1,032,842,659.26
AULAS AUXILIARES EN INSTALACION AÑO 2026 (ADENDAS DE CONTRATOS)	54.00	
AULAS AUXILIARES EN AÑO 2026 RESERVADAS PARA CASOS DE VULNERABILIDAD	6.00	
SUB-TOTAL	60.00	\$192,113,469.34
TOTAL GENERAL DE AULAS AUXILIARES INSTALADAS (2025 / 2026)	410.00	\$1,224,956,128.60
AULAS AUXILIARES A INSTALAR EN AÑO 2026		
EN PROCESO DE CONTRATACION LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) DIE-CCC-LPN-2025-0001	330.00	\$908,300,751.60
POSIBLE ADENDA DEL 25% DE PROCESO NECESARIO) DIE-CCC-LPN-2025-0001 (LPN - SIES	60.00	\$227,075,187.90
SUB-TOTAL DISPONIBLES A INSTALAR	390.00	\$1,135,375,939.50
TOTAL GENERAL DE AULAS AUXILIARES (2025 / 2026)	800.00	\$2,360,332,068.10

RELACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AULAS AUXILIARES 2025 - 2026

Relación de Suministro y Colocación de Aulas Auxiliares
(Total General: 800 Aulas)

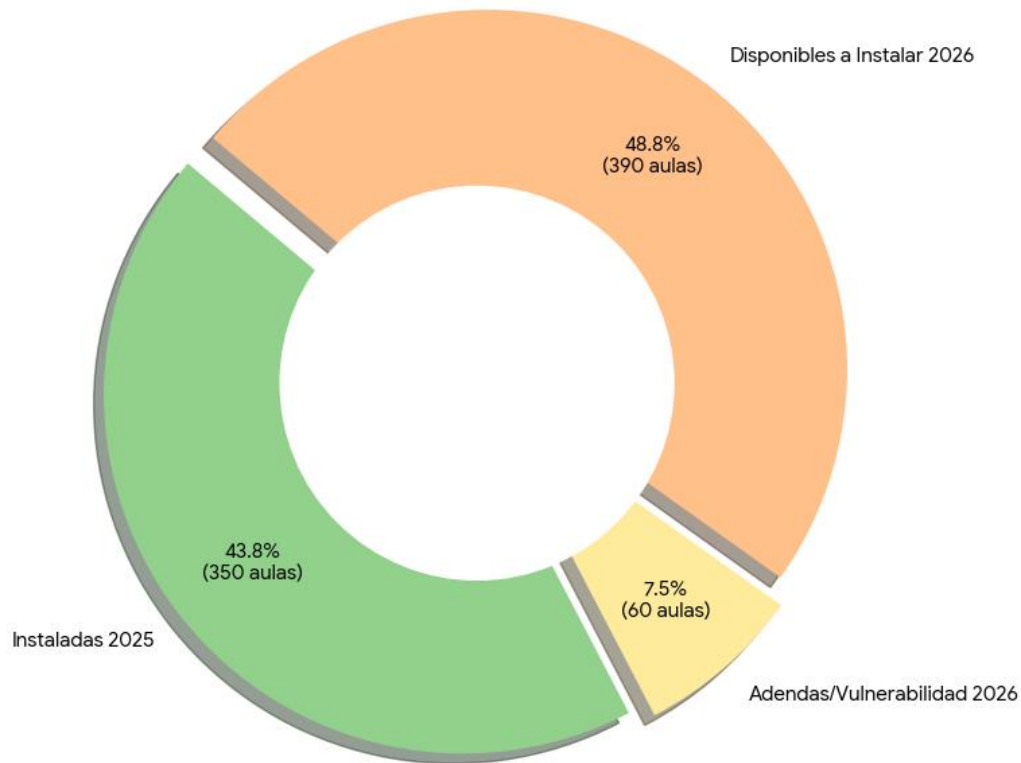



¡ GRACIAS !

